


Glasfaser Ausbauplanung Gronau & Epe



Zusammen für die Zukunft:

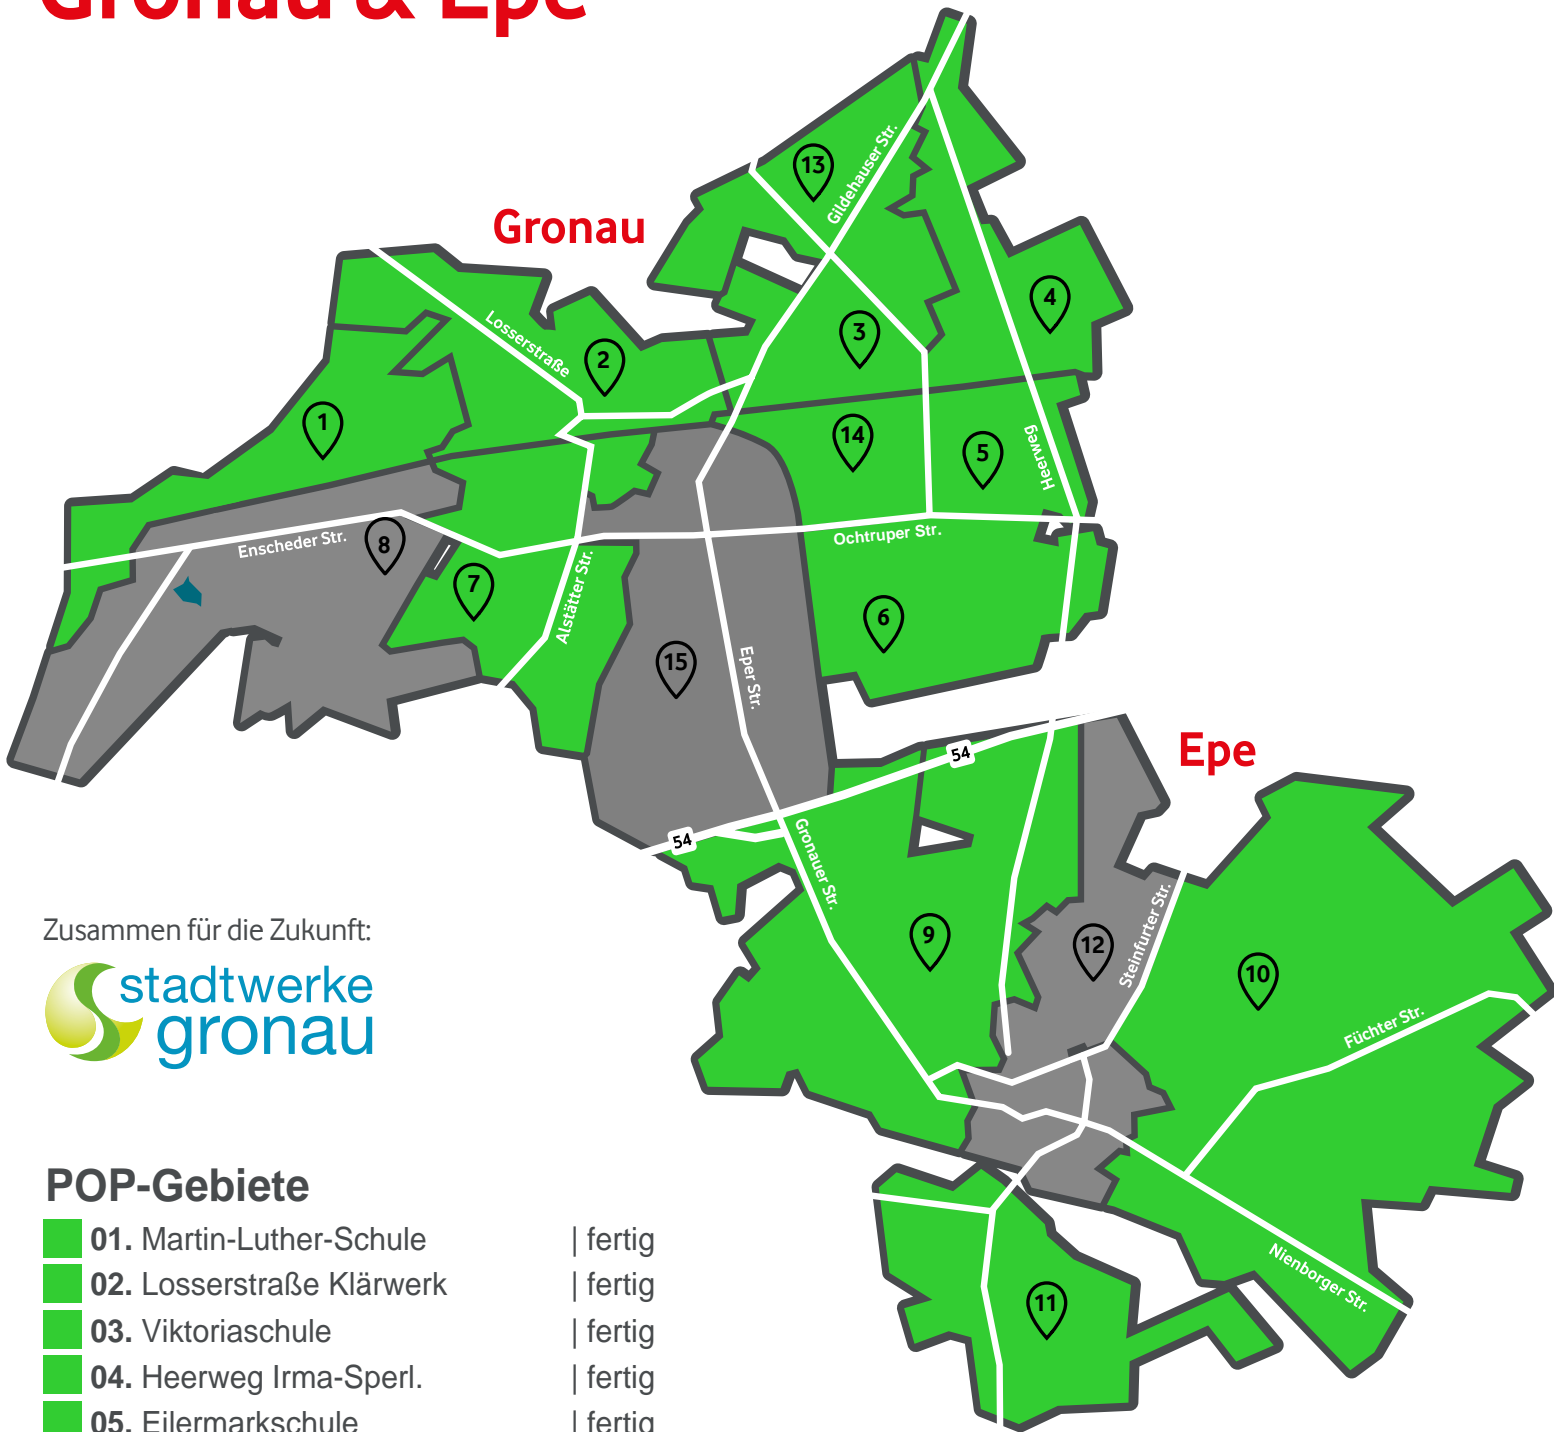

POP-Gebiete

01. Martin-Luther-Schule	fertig
02. Losserstraße Klärwerk	fertig
03. Viktoriaschule	fertig
04. Heerweg Irma-Sperl.	fertig
05. Eilermarkschule	fertig
06. Hallenbad	fertig
07. Driland-Kolleg Iltisstr.	fertig
08. Buterlandschule	Q4 2024 – Q3 2025
09. Euregioschule Epe	fertig
10. Georgschule	fertig
11. Ahauser Straße	fertig
12. Gasstraße Laurenzstraße	Q2 2024 – Q3 2025
13. Gildehauser Straße	fertig
14. Pestalozzischule	fertig
15. Rathaus Gronau	Q1 2025 – Q4 2025

Stand 05.2025: Dieser Plan dient der Illustration des Baufortschritts und stellt keinen rechtsverbindlichen Anspruch auf einen Termin zur Inbetriebnahme des Glasfaserhausanschlusses in den genannten Zeiträumen dar. Auch können wetterbedingte sowie sonstige nicht planbare externe Einflüsse zu Anpassungen führen. Materiallieferungen, Genehmigungsprozesse und sich verändernde Tiefbaukapazitäten können sich ebenso auf die Planung auswirken. Dieser Plan wird laufend aktualisiert.

Deine Stadtwerke Gronau GmbH als Bauherr und Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf als Betreiber

